

**관리번호**  
6-2

## 분류식 하수관로 시설 확충

사업구분	계속사업	사업주체	시
사업기간	2017년~2024년	추진상황(%)	추진 중(90%)
소요예산	126,764백만원	완료시기	임기내
추진부서	도시정비과 하수관리담당 (김진석 ☎4685)	협조부서(기관)	市 건설본부 토목3팀 (김종국 ☎888-6242 조경일 ☎888-6247)

### 【사업추진계획】

#### □ 사업추진목표(최종목표)

- 사하구 일원 분류식 하수관로를 설치하여 수질개선 및 악취 제거를 통해 쾌적한 생활환경 조성

#### □ 사업개요

- 보덕포 일원 하수관로 확충사업
  - 사업규모 : 차집관로 신설(확충) L=7.3km
  - 사업기간 : 2019. 1. ~ 2023. 1. (완료)
  - 사업비 : 29,688백만원
- 하단분구 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)
  - 사업규모 : 차집관로 신설(확충) L=67.27km
  - 사업기간 : 2019. 5. ~ 2024. 11.
  - 사업비 : 77,900백만원
- 신평동 일원 하수관로 확충 사업
  - 사업규모 : 차집관로 신설(확충) L=6.224km
  - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 6.
  - 사업비 : 19,176백만원

#### □ 세부추진계획

##### (단기대책) ▶ 우·오수 분류식 하수관로 설치

- 하단분구 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)
  - 오수관로 L=67.27km, 배수설비 6,280가구
- 신평동 일원 하수관로 확충 사업
  - 오수관로 L=6.224km, 배수설비 1,270가구



○ 하단분구 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	77,900	850	77,050	17,750	24,700	34,600			
국 비									
시 비									
구 비									
기 타	77,900	850	77,050	17,750	24,700	34,600			

○ 신평동 일원 하수관로 확충 사업

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	19,176	4,500	14,676	4,100	5,876	4,700			
국 비	5,752		5,752		4,343	1,409			
시 비	13,424	4500	8,924	4,100	1,533	3,291			
구 비									
기 타									

**【추진실적】**

- 2019. 01. : 보덕포 상류 및 장림시장 일원 오수관로 설치사업 착공 (L=7.2km)
- 2020. 12. : 하단동 일원 오수관로 설치완료 (L=17.7km)
- 2021. 06. : 신평동 일원 오수관로 설치사업 착공
- 2021. 11. : 하단분구BTL(괴정천 상류) 오수관로 설치사업 착공
- 2023. 01. : 보덕포 상류 및 장림시장 일원 오수관로 설치사업 준공

**【금후계획】**

- 신평동 일원 오수관로 설치사업
  - 2024. 6. : 공사 준공예정
- 하단분구 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)
  - 2024. 11. : 공사 준공예정

**【구민소통 실적】**

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	-	-	-

**【기대효과】**


- 분류식 하수관로 등 정비를 통한 악취 제거 및 쾌적한 생활환경 조성

## 【관련사진】

- 보덕포 일원 하수관로 확충사업



- 하단분구 분류식 하수관로 사업

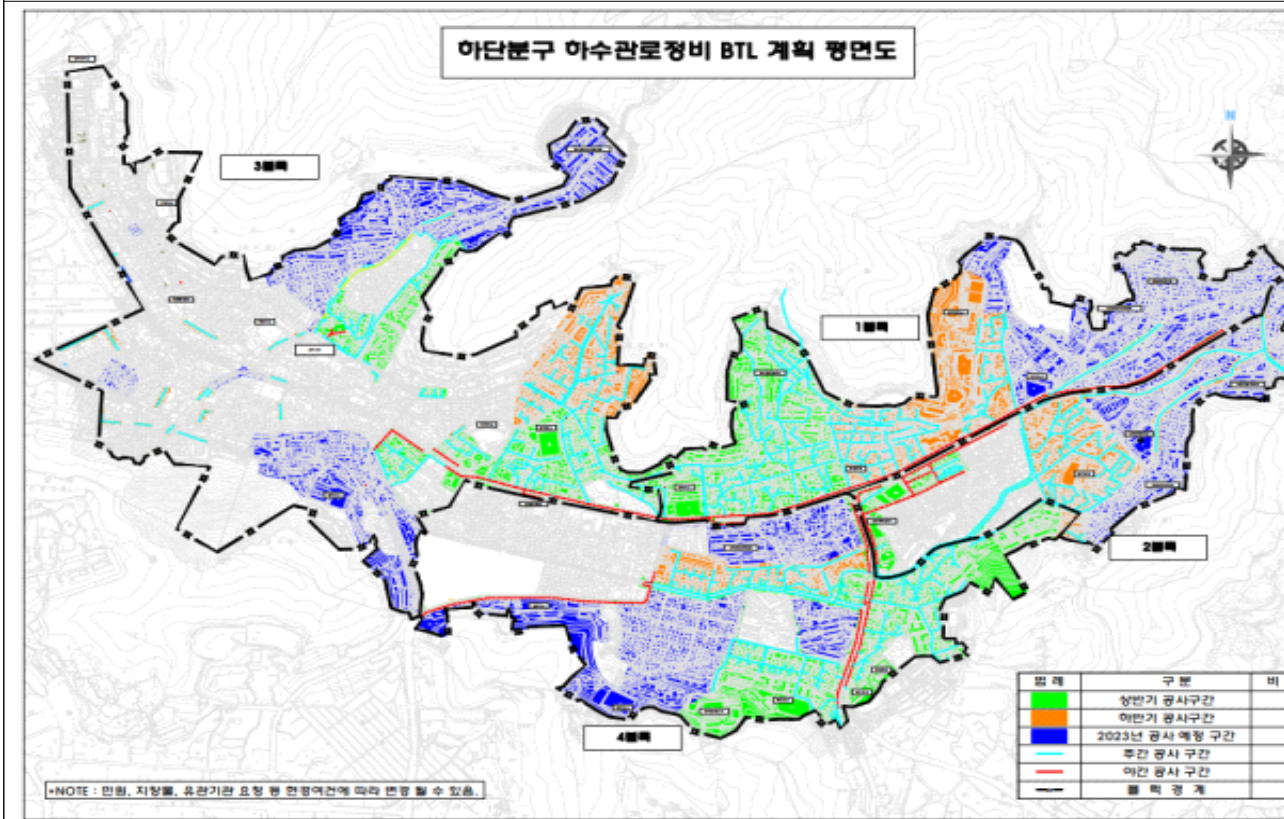

• 신평동 일원 하수관로 확충 사업

